


**BUDOWA OBIEKTU LEKKOATLETYCZNEGO  
I BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY  
POWIATOWYM ZESPOLE NR 2 SZKÓŁ  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA  
SPORTOWEGO I TECHNICZNYCH  
W OŚWIĘCIMIU**



# Wizualizacja

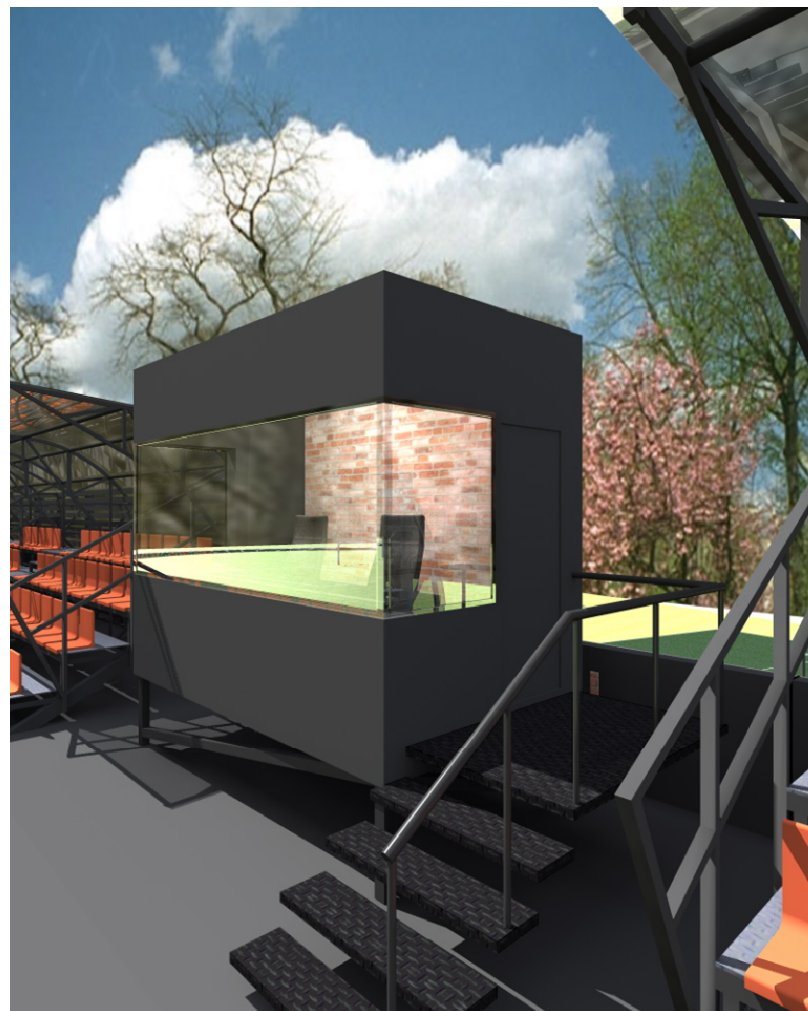

# Wizualizacja



# Wizualizacja



# Charakterystyka inwestycji

Inwestycja polega na budowie infrastruktury sportowej oraz towarzyszącej jej infrastruktury teletechnicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu”.

W ramach inwestycji przewidziano do wykonania m.in.:

- Budowę stadionu lekkoatletycznego z czterotorową bieżnią,
- Budowę dwustronnej skoczni do skoku w dal,
- Budowę rzutni do pchnięcia kulą,
- Budowę dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej,
- Budowę piłkochwytów,
- Budowę zaplecza socjalnego wraz z trybuną, budynku magazynowego i garażu,
- Budowę chodników, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych,
- Budowę odwodnienia boiska, oświetlenia i ogrodzenia.



# Realizacja budowy

## ✓ Postępowanie przetargowe.

W dniu 30.12.2020 roku ogłoszono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 31.03.2021 roku zawarto umowę z Firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „GAWLIK” PAWEŁ GAWLIK z Oświęcimia na kwotę 9.721.302,00 zł brutto.

W dniu 07.04.2021 roku został przekazany plac budowy.

Firma Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost z Bielska-Białej pełni funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



# Realizacja budowy

## ✓ Finansowanie zewnętrzne

1. „KAPLICZKI MAŁOPOLSKI” – pomoc finansowa z budżetu województwa małopolskiego na konserwację zabytkowej kapliczki z 1874 roku w wysokości 15.000,00 zł.
2. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH – dofinansowanie zadania w wysokości 1.000.000,00 zł (nabór II).



# Realizacja budowy

## ✓ Stan realizacji inwestycji

| Lp. | Składniki kosztów przedsięwzięcia                                       | Wartość robót wg umowy [złotych brutto] | Wartość wykonanych robót [złotych brutto] | Wykonanie robót [%] |
|-----|---|---|---|---------------------|
| 1   | BOISKA SPORTOWE, CHODNIKI, PLACE, DROGI WEWNĘTRZNE, WYPOSAŻENIE, ZIELEŃ | 5.094.140,92 zł                         | 979.317,14 zł                             | 19,22 %             |
| 2   | ZAPLECZE SOCJALNE Z TRYBUNĄ   | 2.085.713,53 zł                         | 386.481,78 zł                             | 18,53 %             |
| 3   | BUDYNEK GARAŻU  | 216.864,62 zł                           | 70.865,34 zł                              | 32,68 %             |
| 4   | BUDYNEK MAGAZYNU  | 222.616,86 zł                           | 71.027,21 zł                              | 31,91 %             |
| 5   | INSTALACJA SANITARNA ZEWNĘTRZNA   | 620.026,62 zł                           | 479.459,18 zł                             | 77,33 %             |
| 6   | INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA WEWNĘTRZNA                               | 618.087,00 zł                           | 0,00 zł                                   | 0,00 %              |
| 7   | PRZENIESIENIE KAPLICZKI   | 70.290,86 zł                            | 70.290,86 zł                              | 100,00 %            |
| 8   | INSTALACJE ELEKTRYCZNE  | 793.561,58 zł                           | 247.861,65 zł                             | 31,23 %             |
|     | RAZEM   | 9.721.301,99 zł                         | 2.305.303,16 zł                           | 23,71 %             |





# Realizacja budowy



# Realizacja budowy



# Realizacja budowy




# Realizacja budowy



# Realizacja budowy



# Realizacja budowy

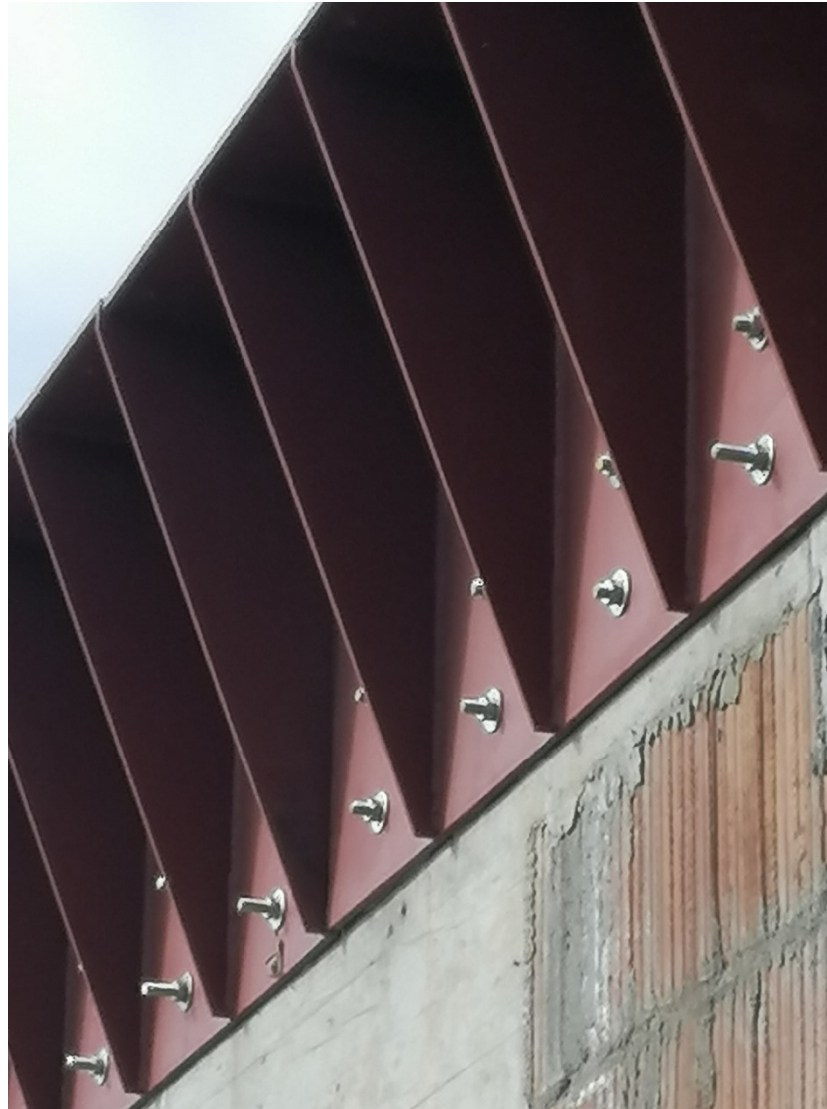

# Realizacja budowy



# Realizacja budowy





# Realizacja budowy



**Dziękuję za uwagę**

