A dark blue ink splatter or blotch is centered on a white background. The splatter has irregular, feathered edges and contains several smaller, lighter blue spots. The text is overlaid on this splatter.

Sprawozdanie z  
działalności Wydziału  
Inwestycji, Rozwoju i

Dróg

2020r.

# Struktura organizacyjna

Naczelnik Wydziału – Łukasz Mędrysa

Wydział Inwestycji rozwoju i Dróg w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu podzielony jest na 3 referaty:

- Referat Inwestycji
- Referat Rozwoju
- Referat Drogowy

# Kierownicy Referatów

- Kierownik Referatu Inwestycji - Piotr Stawarczyk
- Kierownik Referatu Rozwoju – Anna Zajac
- Kierownik Referatu Drogowego – Monika Mech

# Podstawowe zadania referatów

- Referat Inwestycji odpowiada za realizację zadań majątkowych Wydziału.
- Referat Rozwoju nadzoruje zobowiązania finansowe Wydziału, a także odpowiada za pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych.
- Referat Drogowy zajmuje się administracją drogową w tym m.in. zadaniami z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

# Referat inwestycji

# Wykonanie zadań majątkowych w 2020 roku


- W 2020 roku zaplanowano do realizacji przez wydział SIR 30 zadań majątkowych.
- Wykonano 22 zadania, w tym 4 zadania są realizowane jako zadania wieloletnie. Pozostałe 8 zadań są kontynuowane jako zadania, w ramach środków niewygasających.
- Plan po zmianach na realizację zadań majątkowych przez wydział SIR wyniósł 31.541.918,00 zł.
- Wykonanie planu na dzień 31.12.2020r. wyniosło 31.434.351,71 zł, w tym środki, które zostały uznane za niewygasające z końcem roku budżetowego to kwota 2.528.817,00 zł, co stanowi 8,02 % wykonania planu po zmianach.
- Wykonanie planu na dzień 31.12.2020r. bez udziału środków niewygasających wynosi 28.905.534,71 zł, co stanowi wykonanie planu po zmianach w 2020 roku na poziomie 91,64%.

Rok	Plan po zmianach na 31.12.2020r. - zadania majątkowe SIR	Wykonanie na 31.12.2020r.	w tym środki niewygasające	Środki niewygasające do planu po zmianach [%]	Wykonanie na 31.12.2020r. bez wydatków niewygasających	Liczba zadań majątkowych SIR	Liczba zadań niewygasających SIR	Wykonanie na 31.12.2020r. (bez niewygasających) [%]
2020	31 541 918,00	31 434 351,71	2 528 817,00	8,02%	28 905 534,71	30	11	91,64%

# Zadania inwestycyjne

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski.**
- W 2020 roku kwota wydatkowana na zadanie wyniosła 1.214.780 zł; zrealizowano przebudowę ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu (odcinek nr I i II). W trakcie realizacji jest przebudowa odcinka nr III. Kwotę 666.734 zł uznano jako wydatki niewygasające z upływem roku 2020 co oznacza, że wydatki można realizować do końca czerwca 2021 r.
- Źródłem finansowania inwestycji są środki powiatu oświęcimskiego, miasta Oświęcim i Funduszu Dróg Samorządowych.
- Zakres robót budowlanych wykonanych na ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu (odcinek I i II) obejmował m.in.: przebudowę jezdni, przebudowę chodników, przebudowę wysp azylu w rejonie „ronda” przed dworcem PKP, przebudowę wysp kanalizujących, przebudowę pierścienia „ronda” przed dworcem PKP, przebudowę elementów odwodnienia (wpustów deszczowych wraz z przykanalikami), remont miejsc postojowych przy ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu objętych zakresem inwestycji (około 22 mb) - korekta geometrii jezdni w celu poprawy bezpieczeństwa, remont zjazdów, zabezpieczenie infrastruktury technicznej.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski.**

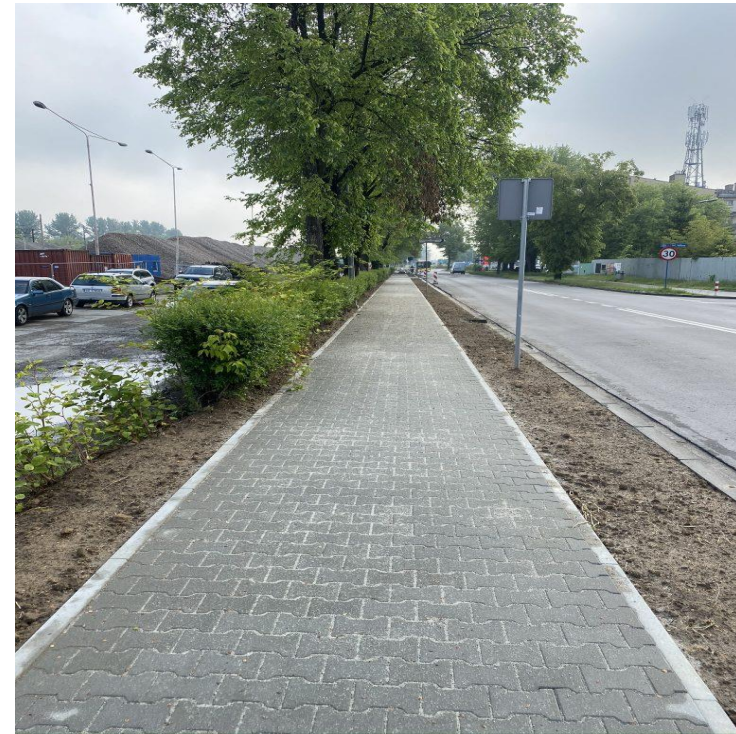



# Zadania inwestycyjne

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski.**

- W 2020 roku kwota wydatkowana na zadanie wyniosła 9.120.040 zł. Ponadto, kwotę 345.780 zł uznano jako wydatki niewygasające z upływem roku 2020, co oznacza, że wydatki mogą być realizowane do końca czerwca 2021r.
- Źródłem finansowania inwestycji są środki powiatu oświęcimskiego, gminy Przeciszów i Funduszu Dróg Samorządowych.
- W ramach zadania inwestycyjnego do końca października 2021 roku zostanie przebudowany pas drogowy drogi powiatowej nr 1895K. W 2020 roku został wykonany odcinek nr I. Realizację odcinka nr II rozpoczęto w 2020 roku z terminem wykonania do końca maja 2021 roku. Roboty budowlane dotyczące odcinka nr III planowane są do wykonania w 2021 roku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przekiszów, powiat oświęcimski.**



# Zadania inwestycyjne

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w m. Zaborze.**
- Zadanie było realizowane w latach 2019 – 2020. W ramach zadania wykonano koncepcję projektową oraz dokumentację projektowo-kosztorysową (2019 – 2020 rok), na podstawie której w 2020 roku wykonano roboty budowlane. Zakres inwestycji obejmował odcinek drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w Zaborzu od km 3+859,00 do km 3+946,00 i polegał na: budowie jednostronnego chodnika, wykonaniu odwodnienia drogi, wykonaniu pobocza, remoncie istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nakładki asfaltowej warstwy ścieralnej, przebudowie istniejących zjazdów, wykonaniu oznakowania poziomego drogi, montażu urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (balustrada U-11a), budowie kanału technologicznego.
- Źródłem finansowania inwestycji był powiat oświęcimski i gmina Oświęcim.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w m. Zaborze.**



# Zadania inwestycyjne

- **Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości.**
- Na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę: 67.896 zł. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uchwałą nr 108/377/2020 z dnia 23.06.2020 r. przyjął do realizacji program mający na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych realizowanych wspólnie przez Powiat Oświęcimski oraz Gminy leżące w jego granicach administracyjnych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości. W ramach programu w roku 2020 zamontowano sześć urządzeń zasilanych solarnie w ciągu następujących dróg powiatowych: ul. Kasztanowa w Polance Wielkiej, ul. Oświęcimska w Głębowicach, ul. Wyzwolenia w Przecieszynie, ul. Oświęcimska w Skidzinie.
- Powiat Oświęcimski będzie kontynuował ww. program w kolejnych latach.

- **Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości.**



# Zadania inwestycyjne

- **Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1811K ul. Kongresowa w Zatorze.**
- Na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę: 149.747 zł. Roboty budowlane rozpoczęto i zakończono w 2020 roku. Zakres inwestycji obejmował: rozebranie starej nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżem, ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżem.
- Źródłem finansowania inwestycji był powiat oświęcimski i gmina Zator.

- **Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1811K ul. Kongresowa w Zatorze.**





# Zadania inwestycyjne

- **Budowa chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Babicach na odcinku od DK 44 do ul. Różanej.**
- Na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę: 245.070 zł. Roboty budowlane rozpoczęto i zakończono w 2020 roku. Zakres inwestycji obejmował odcinek drogi powiatowej nr 1879K ul. Grunwaldzka w Babicach na odcinku od drogi krajowej nr 44 do ul. Różanej. W ramach przedsięwzięcia wykonano m.in.: podbudowę i chodnik oraz zjazdy do posesji, odwodnienie drogi wraz z kanalizacją i zbiornikiem rozsączającym, frezowanie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej, nową nawierzchnię jezdni, oznakowanie poziome i pionowe. Ponadto, zamontowano krawężniki i obrzeża ograniczające chodnik.
- Źródłem finansowania inwestycji był powiat oświęcimski i gmina Oświęcim.

- Budowa chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Babicach na odcinku od DK 44 do ul. Różanej.



# Zadania inwestycyjne

- **Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Jazowa w Grodzisku.**
- Na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę: 73.617 zł. Roboty budowlane rozpoczęto i zakończono w 2020 roku. Zakres inwestycji obejmował: wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przejścia dla pieszych wraz z montażem oświetlających go dwóch lamp solarnych, a także wykonanie dwóch spoczników z kostki betonowej obramowanego krawężnikiem i obrzeżem trawnikowym na odcinku o długości 29 m. Po obu stronach przejścia wykonano kostkę integracyjną Braille'a.
- Źródłem finansowania inwestycji był powiat oświęcimski i Gmina Zator.



- **Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Jazowa w Grodzisku.**



# Zadania inwestycyjne

- **Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1859K ul. Jędrzejowskiego w Malcu.**
- Na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę: 36.999 zł. Roboty budowlane rozpoczęto i zakończono w 2020 roku. Zakres inwestycji obejmował odcinek drogi powiatowej nr 1859K ul. Jędrzejowskiego w Malcu od km 3+160,00 do km 3+780,00. W ramach przedsięwzięcia wykonano odnowienie oznakowania poziomego drogi, zamontowano dodatkowe znaki pionowe, zamontowano tablicę solarną do pomiaru prędkości, naprawiono nawierzchnię chodnika przy moście wraz z montażem wpustu ulicznego.
- Źródłem finansowania inwestycji był powiat oświęcimski i gmina Kęty.

- **Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1859K ul. Jędrzejowskiego w Malcu.**

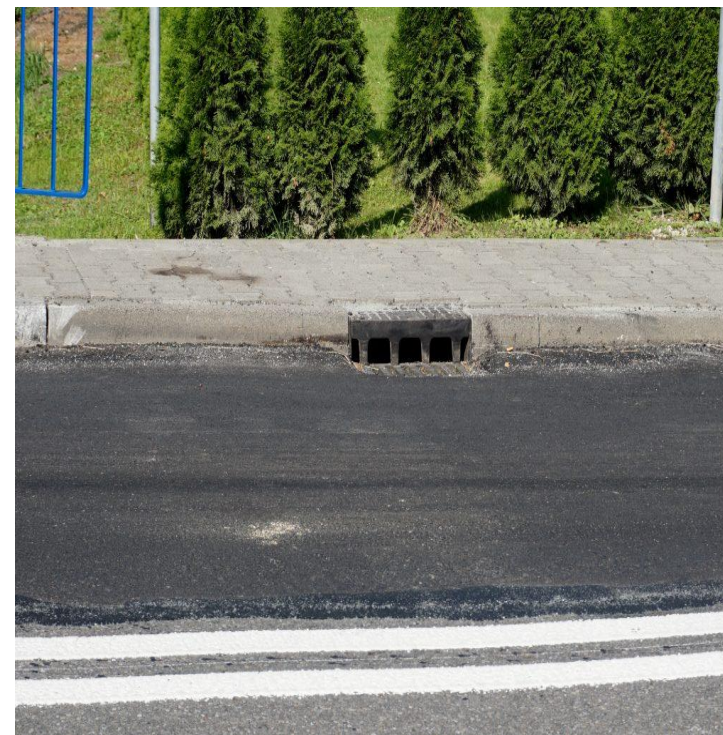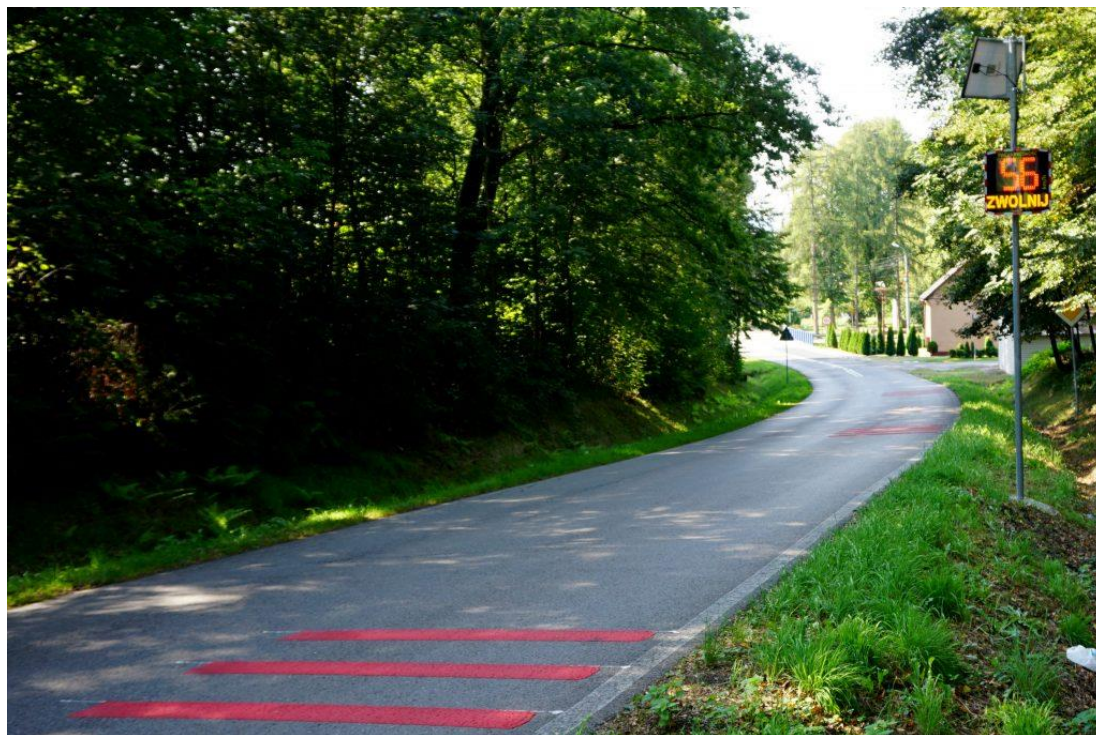

# Zadania inwestycyjne

- **Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu.**
- Na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę: 3.067.280 zł. Źródłem finansowania inwestycji był powiat oświęcimski, miasto Oświęcim oraz Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy Etap V – 2016-2020.
- Zadanie było realizowane w latach 2019 – 2020. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową (2019 – 2020 rok), na podstawie której w 2020 roku wykonano roboty budowlane. Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 1891K ul. Tysiąclecia w Oświęcimiu na odcinku o długości około 637 m od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Chemików (droga wojewódzka nr 933). Przedsięwzięcie polegało na: przebudowie jezdni (wymiana warstw konstrukcyjnych oraz korekta wysokościowa), przebudowie chodników, rozbiórce i budowie ścieżki rowerowej, rozbiórce i budowie sieci oświetleniowej ulicznej, remoncie zjazdów, budowie miejsc postojowych, przebudowie opaski, budowie kanału technologicznego, remoncie sieci kanalizacji deszczowej, rozbiórce i budowie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego drogi. Dodatkowo zostały zamontowane elementy bezpieczeństwa ruchu w postaci słupków detekcji rowerzystów, znaku aktywnego D-6b z oświetleniem przejścia dla pieszych, barierki U-11a (w miejsce rozebranych barier na istniejącym przepuście) oraz wybudowane zostało oświetlenie przejść dla pieszych. Ponadto wykonano tablicę pamiątkową dotyczącą inwestycji.

- **Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu.**





# Zadania inwestycyjne

- **Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap I.**
- Kwota łączna wydatkowana na I etap inwestycji wyniosła 19.403.421 zł. (w tym, w 2020 roku 1.697.522 zł). Zadanie było realizowane w latach 2017 – 2020. W ramach zadania zlecono wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) oraz dokumentacji aranżacji wnętrz wraz z aranżacją i zestawieniem wyposażenia w meble, sprzęt i urządzenia. Wykonano roboty budowlane polegające na adaptacji istniejącego budynku po Powiatowym Zespole Nr 5 wraz z nadbudową i wykonaniem nowej zewnętrznej klatki schodowej. Wybudowano nowe skrzydło budynku w miejscu wyburzonej sali gimnastycznej. Prace prowadzono w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonano roboty budowlane dotyczące układu komunikacyjnego wokół budynku SOSW (budowa i remont drogi wewnętrznej oraz miejsc postojowych, budowa zatok komunikacyjnych, chodnika oraz placów apelowych, utwardzenie terenu, wykonanie oznakowania poziomego, roboty zabezpieczające i wykończeniowe). Do SOSW dostarczono i zamontowano: sprzęt elektryczny, AGD i RTV, sprzęt sportowy, sprzęt specjalistyczny, sprzęt sanitarny, sprzęt kuchenny, sprzęt warsztatowy, umywalki wraz z armaturą, prysznic bezpieczeństwa wraz z oczomyjką, centralę telefoniczną, elementy aranżacji wnętrz, elementy graficzne, system dzwonek, sprzęt komputerowy, meble standardowe i meble na wymiar.

- Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap I.



# Zadania inwestycyjne

- **Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap II.**
- W ramach przeprowadzonych negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą robót tj. Firmą „KOMABUD” – FIRMA BUDOWLANA, Kowalski, Mazur Spółka Jawna z Oświęcimia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawarto w dniu 17.06.2019 roku umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla II etapu inwestycji. Wartość umowy wynosi 20.223.000,00 zł brutto. Firma MSD ARCHITEKCI Marek Domagalski z Sosnowca została podwykonawcą w zakresie wykonania kompletnej dokumentacji projektowej. Firma G.P INWESTIM Sp. z o. o. pełni funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Firma WODPOL Sp. z o. o. pełni funkcję Generalnego Podwykonawcy.
- Etap II – obejmuje funkcje wspólne – stołówka z kuchnią dla całego kompleksu, główna świetlica oraz pomieszczenia administracyjne Szkoły Podstawowej; Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR) – strefa z pomieszczeniami przeznaczonymi na terapię i rehabilitację dzieci najmłodszych; Strefa Ciszy – wydzielona funkcjonalnie strefa z pomieszczeniami do terapii i rehabilitacji dzieci autystycznych i dzieci z upośledzeniem głębokim; Internat, Pomieszczenia do hydroterapii.
- W dniu 16.01.2020 roku Powiat Oświęcimski uzyskał pozwolenie na budowę. Decyzja z dniem 31.01.2020 roku stała się ostateczna.

- **Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap II.**



# Zadania inwestycyjne

- **Remont sali gimnastycznej w PZ nr 6 w Brzeszczach.**
- Na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę: 24.189 zł.
- W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na malowaniu wewnętrznych ścian i sufitów sali gimnastycznej w Powiatowym Zespole Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach. Zadanie było finansowane w całości ze środków powiatu oświęcimskiego.

# Zadania inwestycyjne

- **Modernizacja budynku SOSW przy ul. Kościelnej 6 w Oświęcimiu.**
- Na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę: 18.973 zł.
- W ramach zadania wykonano remont dachu, niezbędne prace towarzyszące oraz roboty budowlane w zakresie uszczelnienia połączeń pomiędzy elementami pokrycia dachowego oraz między pokryciem dachowym a budynkiem. Zadanie było finansowane w całości ze środków powiatu oświęcimskiego.

- **Modernizacja budynku SOSW przy ul. Kościelnej 6 w Oświęcimiu.**



# Zadania inwestycyjne

- **Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w PZ Nr 4 w Oświęcimiu.**
- Na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę: 55.371 zł.
- Roboty budowlane rozpoczęto i zakończono w 2020 roku. W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe nawierzchni z kostki brukowej wzdłuż fundamentów, roboty ziemne polegające na odkryciu fundamentów, poziomą izolację przeciwwilgociową od wewnątrz budynku na poziomie posadzki betonowej, pionową izolację przeciwwilgociową od strony zewnętrznej budynku, odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej, renowację tynków piwnic, ściankę dociskową do istniejących ścian zsypu, podniesienie muru przy schodach wejściowych. Zadanie było finansowane w całości ze środków powiatu oświęcimskiego.



- **Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w PZ Nr 4 w Oświęcimiu.**



# Zadania inwestycyjne

- **Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach.**
- Na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę: 1.618.650 zł.
- Zadanie było objęte dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie było realizowane w latach 2019 – 2020. W ramach przedsięwzięcia wybudowano kompleks sportowy składający się z boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki siatkowej, plażowej, bieżni 4-torowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż, skoczni do skoku w dal i trójskoku, piłkochwyków oraz ławek. Ponadto, wykonano instalację oświetlenia zewnętrznego oraz kanalizację drenarską. Prace były nadzorowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W ramach inwestycji wykonano i zamontowano tablicę informacyjną.

- **Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach.**



# Referat Rozwoju

# Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie zadań w 2020 roku

- 1) Środki unijne (EFRR) - liczba złożonych wniosków: 1
- 2) Fundusz Dróg Samorządowych - liczba złożonych wniosków: 2
- 3) Budżet państwa - Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - liczba zadań: 1
- 4) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - liczba złożonych wniosków: 7
- 5) Budżet państwa - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - liczba złożonych wniosków: 1 (na 5 dróg) – brak rozstrzygnięcia naboru ze względu na COVID-19
- 6) Województwo Małopolskie - doświetlenie przejść dla pieszych - liczba złożonych wniosków: 1 (na 5 przejść dla pieszych) – brak rozstrzygnięcia naboru ze względu na COVID-19

# Liczba i kwota otrzymanych dofinansowań na podstawie wniosków złożonych w 2020 roku

- 1) Środki unijne (EFRR) - liczba otrzymanych dofinansowań: 1 – kwota 1.358.439,00 zł
- 2) Fundusz Dróg Samorządowych - liczba otrzymanych dofinansowań: 2 – kwota 1.424.299,00 zł
- 3) Budżet państwa - Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - liczba otrzymanych dofinansowań: 1 – kwota 2.429.000,00 zł
- 4) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - liczba otrzymanych dofinansowań: 1 – kwota 6.679.295,00 zł

# Dofinansowanie otrzymane w 2020 roku

Lp.	Program	Kwota dofinansowania		
		2019	2020	2021
1.	Środki unijne - EFRR	2 104 974,79	1 534 483,15	1 632 252,00
2.	Fundusz Dróg Samorządowych	5 543 544,00	6 055 235,00	2 753 300,00
3.	Budżet państwa - Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy	1 619 000,00	2 429 000,00	4 356 000,00
4.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		6 679 295,00	1 000 000,00
5.	Budżet państwa - rezerwa celowa	1 230 781,00		
6.	Budżet państwa - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	550 000,00	37 798,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>11 048 299,79</b>	<b>16 735 811,15</b>	<b>9 741 552,00</b>

# Referat Drogowy



## ADMINISTRACJA DROGOWA W 2020r. w liczbach:

1	Decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym	186 decyzji
2	Decyzje na zajęcie pasa drogowego w celach innych niż prowadzenie robót (kioski w pasie drogowym, reklamy, tabliczki itp.)	31 decyzji
3	Decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym	123 decyzje
4	Decyzje na lokalizację sieci w pasie drogowym (energetycznej, wodociągowej, teletechnicznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej )	151 decyzji
5	Uzgodnienia projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w odniesieniu do terenów w obszarze pasa drogowego)	21 uzgodnień

## ADMINISTRACJA DROGOWA W LICZBACH:

6	Uzgodnienie miejscowych planów zagospodarowania terenu oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	12 uzgodnień
7	Uzgodnienia projektów budowlanych	29 uzgodnień
8	Uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy (w zakresie dostępu do dróg powiatowych)	52 uzgodnienia
9	Uzgodnienie usytuowania przy drodze obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	24 uzgodnienia
10	Uzgodnienia przebudowy i remontów sieci w pasie drogowym (energetycznej, wodociągowej, teletechnicznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, modernizacje budynków )	28 uzgodnień
11	Oświadczenia o warunkach i możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego z terenu przyległego do pasa drogowego	68 oświadczeń

## ADMINISTRACJA DROGOWA W LICZBACH:

12	Uzgodnienia zmian zagospodarowania terenu	15 uzgodnień
13	Decyzje zezwalające na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg powiatowych	87 decyzji
14	Decyzje odmowne na lokalizację zjazdów	6 decyzji
15	Uzgodnienie projektów zjazdów indywidualnych i publicznych	44 uzgodnień
16	Uzgodnienie zezwalające na lokalizację lub remont ogrodzenia	21 uzgodnień
17	Decyzje zezwalające na wykorzystanie dróg w sposób szczególny	7 decyzji

## ADMINISTRACJA DROGOWA W 2020r. w liczbach:

18	Opiniowanie w zakresie wykorzystania dróg w sposób szczególny	22 opinie
19	Sprawy związane z wypłatą odszkodowań powstałych na drogach powiatowych. W porównaniu z rokiem 2019 istnieje tendencja spadkowa.	36 spraw
20	Ubezpieczenia majątkowe- zwrot kosztów w przypadku uszkodzenia oznakowania na drogach powiatowych	4 sprawy
21	Zezwolenia na przejazd pojazdów o masie większej niż przewidziana dla danej drogi	137 zezwoleń
22	Decyzje oraz opinie na przejazd pojazdów nienormatywnych	39 spraw

**Razem: 1143 spraw**

**Zadania referatu drogowego obejmują również kwestię regulacji stanu prawnego działek, na których zlokalizowane są drogi powiatowe. W roku 2020 wystąpiono o regulację działek w zakresie prowadzonych inwestycji drogowych na następujących drogach powiatowych:**

1. Nr 1872K ul. Kobylec w Jawiszowicach
2. Nr 1819K ul. św. M. Kolbe w Kętach
3. Nr 1816K ul. Beskidzka w Witkowicach
4. Nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach
5. Nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku
6. Nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie
7. Nr 1891K ul. Tysiąclecia w Oświęcimiu
8. Nr 1880K ul. Kolbego, Nr 1880K ul. Wyzwolenia , Nr 1881K ul. Leszczyńskiej, Nr 1878K ul. Męczeństwa Narodów w Oświęcimiu
9. Nr 1887K ul. Olszewskiego w Oświęcimiu
10. Nr 1758K ul. Wadowicka w Głębowicach
11. Nr 1895K: ul. Leśna w m. Las, ul. Podlesie w Przeciszowie, ul. Oświęcimska w Dworach Drugich
12. Nr 1895K ul. Grojecka w Zaborzu

**Ponadto referat drogowy realizuje zadania z zakresu ustawy prawo o ruchu drogowym, działając z upoważnienia Starosty jako organu zarządzającego ruchem po drogach powiatowych i gminnych. W ramach tych zadań referat koordynuje i opiniuje prace związane z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego tj. opiniuje i zatwierdza organizację ruchu.**

W roku 2020:

- zaopiniowano 55 projektów organizacji ruchu
- zatwierdzono 239 projektów organizacji ruchu
- wprowadzono 13 zmian organizacji ruchu protokołem.
- **Razem: 307 projektów organizacji ruchu.**

Opiniowane były również takie projekty jak:

1. „Budowa drogi S-1 Koszowy – Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice”
2. Budowy drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej wg wariantu E

**W 2020r. referat drogowy realizował program przyjęty Uchwałą nr 108/377/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23.06.2020 r. mający na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości.**

Program realizowany był przez Powiat Oświęcimski przy współudziale Gmin.

W ramach programu w roku 2020 zamontowano sześć urządzeń zasilanych solarnie w ciągu następujących dróg powiatowych: ul. Kasztanowa w Polance Wielkiej, ul. Oświęcimska w Głębowicach, ul. Wyzwolenia w Przecieszynie, ul. Oświęcimska w Skidziniu. Kwota łączna wydatkowa na ten cel: 67.896 zł.

**W zakresie zadań związanych z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych referat drogowy realizuje częściowe drogi powiatowych, bieżące utrzymanie dróg, koszenie poboczy oraz utrzymanie dróg w zakresie oznakowania poziomego oraz pionowego wraz z sygnalizacją świetlną.**

1.	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego w latach 2020-2021 w zakresie utrzymania nawierzchni oraz urządzeń odwadniających.	480.584,00
2.	Remonty częściowe - pozimowe i letnie łatanie wybojów i ubytków jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w latach 2020-2021	586.639,65
3.	Koszenie pasa zieleni na poboczach dróg powiatowych Powiatu Oświęcimskiego w 2020 roku	186.072,00
4.	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w sezonach: 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021	739.991,90
5.	Bieżące utrzymanie oznakowania oraz urządzeń BRD dróg powiatowych w Powiecie Oświęcimskim w 2020 r.	157 206,00
6.	Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń drogowych sygnalizacji świetlnej zamontowanych na przejściach dla pieszych i na skrzyżowaniach dróg powiatowych w 2020 r.	152 815,20

**Razem: 2 303 308,75 zł**
